Jernbaneverket

Planlagte vedlikeholdstiltak* for bedre punktlighet

Strekning

ØSTFOLDBANEN (Ski-Kornsjø)
- Forsert skogrydding
- Forberedelse til ballastrensing
- Stasjoner- og plattformutbedringer
- Fornye av og påstigning til treplattform prosjektering: *noe forsinket*

ALNABRU
- Fornyelse av vekselvarme og returkretsen på Alnabru

KONGSVINGERBANEN (Lillestrøm-Charlottenberg)
- Ballastrensing
- Fornyelse av El-kraftanlegg på Kongsvinger stasjon

GJØVIKBANEN (Grefsen-Gjøvik)
- Forsert skogrydding
- Bytte betongsviller med alkaliereaksjon
- Skinnebytte

VESTFOLD- OG BRATSBERGBANEN (Drammen-Skien-Nordagutu)
- Forberedelse til ballastrensing
- Svillebytte
- Skinnebytte
- Utskifting av isolerte skjøter
- Fornyelse av sporveksler
- Fornyelse av gjerder
- Fornyelse av drensanlegg
- Nøytralisering av skinner
- Fornyelse av kontaktledningsanlegg
- Ny sporplan Kongsberg stasjon
- Forbedring av publikumsinfo på stasjoner

Fremdrift i % i 2010 pr 31. desember**

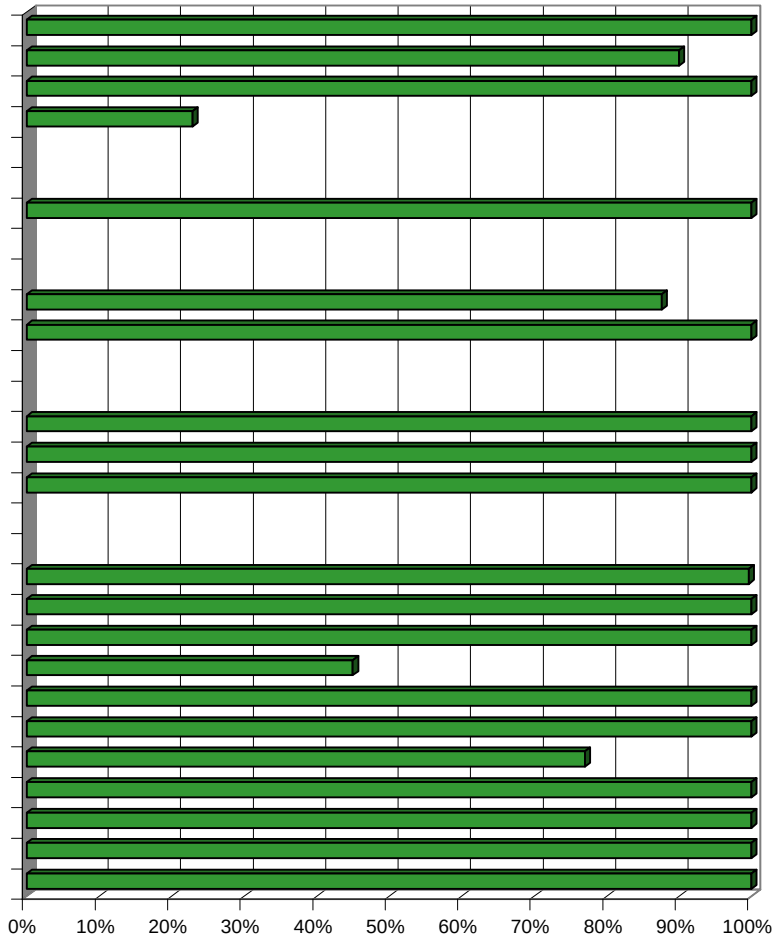

* Vedlikeholdstiltak: utskifting av komponenter og anlegg
Oversikten viser større tiltak, det gjennomføres også en lang rekke mindre tiltak som i sum skal bidra til bedre punktlighet og regularitet
** Fremdrift = produsert verdi
